

绩效评价

项目名称：合水县智能停车场建设项目2021年新增
政府专项债券项目资金绩效评价
项目编号：天一会咨字[2022]5号



甘肃天一会计师事务所有限公司

GANSU TIANYI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

合水县智能停车场建设项目 2021 年新增政府专项债券项目资金 绩效评价报告

评价类型：☒实施过程评价 ☐完成结果评价

项目名称：合水县智能停车场建设项目2021年新增
政府专项债券项目资金绩效评价

主管部门：合水县住房和城乡建设局

委托单位：合水县财政局

评价时间：2022年6月24日至2022年6月30日

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构：☒中介机构 ☐专家组织 ☐项目单位评价组

评价单位（盖章）：甘肃天一会计师事务所有限公司

2022年6月30日



目 录

摘 要	- 1 -
一、项目基本情况	- 2 -
(一)项目概况	- 2 -
1. 项目立项背景	- 2 -
2. 项目立项情况	- 4 -
3. 项目主要内容及投资估算	- 4 -
4. 项目实施情况	- 4 -
(二)项目绩效目标	- 4 -
二、绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一)绩效评价目的	- 6 -
(二)绩效评价对象	- 7 -
(三)绩效评价依据	- 7 -
1. 政策依据	- 7 -
2. 评价依据	- 8 -
(四)绩效评价原则	- 8 -
1. 科学规范	- 8 -
2. 协同配合	- 9 -
3. 公开透明	- 9 -
4. 激励约束	- 9 -
(五)评价指标体系	- 9 -
(六)绩效评价方法	- 12 -

1. 成本效益分析法	- 12 -
2. 比较法	- 12 -
3. 因素分析法	- 13 -
4. 公众评判法	- 13 -
(七)评价标准	- 13 -
(八)绩效评价实施过程	- 13 -
1. 项目前期调研	- 13 -
2. 制定工作方案	- 13 -
3. 组织实施	- 14 -
4. 分析评价及绩效打分	- 15 -
5. 撰写报告阶段	- 15 -
三、综合评价情况及评价结论	- 16 -
(一)绩效评分	- 16 -
(二)评价结论	- 19 -
四、绩效评价指标分析	- 19 -
(一)项目决策情况（20 分）	- 20 -
1. 项目立项（5 分）	- 20 -
2. 前期工作（5 分）	- 21 -
3. 资金投入（2 分）	- 23 -
4. 专项债券安排（4 分）	- 23 -
5. 绩效目标（4 分）	- 24 -
(二)项目管理情况（40 分）	- 24 -

1. 专项债券管理（13 分）	25 -
2. 资金使用管理情况（12 分）	27 -
3. 项目组织管理（15 分）	29 -
(三)项目产出情况（25 分）	30 -
1. 建设产出数量（7 分）	30 -
2. 建设产出质量（6 分）	31 -
3. 建设产出时效（6 分）	31 -
4. 建设产出成本（6 分）	32 -
(四)项目效益情况（15 分）	32 -
1. 项目综合效益（6 分）	32 -
2. 项目带动社会有效投资（3 分）	33 -
3. 项目支持国家及本市重大区域发展战略情况（3 分）	34 -
4. 满意度（3 分）	34 -
五、主要经验及做法及存在的问题.....	34 -
(一)主要经验及做法	34 -
(二)存在的问题	35 -
六、有关建议	36 -
七、其他需要说明的问题	36 -
(一)抽样调查的局限性	36 -
(二)本次绩效评价的局限性	36 -

摘 要

为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，甘肃天一会计师事务所有限公司受合水县财政局委托，于2022年6月24日至2022年6月30日对合水县智能停车场建设项目进行了绩效评价。

本次绩效评价通过了解合水县智能停车场建设项目实施情况、预期目标的实现程度和实施效果，对政府专项债券项目资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，重点从新增政府专项债券资金项目的项目决策、管理、产出和效益情况进行绩效评价。

通过绩效评价综合打分，合水县智能停车场建设项目绩效评价总分为**93.40分**，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

总体认为，合水县智能停车场建设项目为具有一定收益的公益性项目，符合专项债券支持领域；项目实施符合城市发展规划；实际建设内容与批复建设内容一致；项目资金使用基本合规；项目的实施对解决合水县停车难问题，缓解市内交通拥堵具有重要作用，对促进城市交通与

县域经济协调发展，构建和谐社会，提升居民幸福指数具有重要的意义。

但与此同时，还存在项目绩效目标还需细化分解；专项债券收支情况未进行账务处理；项目前期勘察、设计等费用尚未支付等问题。

甘肃天一会计师事务所有限公司

2022年6月30日

甘肃天一会计师事务所有限公司文件

天一会咨字[2022]5 号

合水县智能停车场建设项目 2021 年新增政府专项债券资金 绩效评价报告

合水县财政局：

为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，甘肃天一会计师事务所有限公司接受贵局委托，组成绩效评价工作组，于2022年6月24日至2022年6月30日，对合水县智能停车场建设项目新增政府专项债券资金进行了绩效评价。

本次绩效评价所需资料由合水县财政局、合水县住房和城乡建设局及项目实施单位提供，并对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》

等文件规定开展绩效评价。

在绩效评价过程中，我们结合合水县智能停车场建设项目建设情况，实施了包括查阅项目建设管理资料、财务核算资料、访谈、询问、现场勘察等必要的程序，收集绩效评价相关数据资料，对项目实施情况进行了核实与评价，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了“合水县智能停车场建设项目新增2021年政府专项债券项目资金”绩效评价报告，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

根据《合水县中心城区控制性详细规划》，合水县新的行政办公区主要为秦直路以东、古象路以南、成业路以西、广场路以北的区域内。目前该区域内已建成的主要单位有合水县统办大楼、合水县公安局、合水县人社局、合水县妇幼保健医院、合水县消防中队及合水县政务服务中心等集中办公场所。近年来，合水县中心城区在道路建设方面的力度较大，“行车难”的问题在一定程度上得到解决，但中心城区的停车设施滞后于实际的需要，停车难问题没有得到根本性的解决，甚至有加剧趋势。如果不能处理好停车供给与需求的矛盾，将会影响合水县城城市交通的可持续发展，影响城市功能的进一步提升，阻碍城市交通

与社会经济的协调发展。

目前合水县中心城区没有停车位，很多空间较小的老旧小区或一些新建小区也存在车位、车库规划欠缺的问题。在城区大街小巷的马路边、人行道等未划定停车位的区域都停着车，夜间“无家可归”的车辆较多。随着城区小汽车保有量的激增，停车难的问题逐步凸显，车多位少的矛盾越来越突出，停车难日益成为关乎民生的大问题。

为进一步改善城市交通环境，有效缓解中心城市停车难问题，《中华人民共和国城乡规划法》《道路交通安全法》《关于加强城市停车设施建设的指导意见》（发改基础〔2015〕1788号）和《关于印发加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工的通知》（发改基础〔2016〕159号）以及《甘肃省城市停车场规划建设和管理暂行办法》等法律、法规及政策文件中提出：要立足中心城市交通发展战略，以停车产业化为导向，着眼当前、惠及长远，统筹推进城市综合交通体系和城市公共服务配套场（库）建设，加强运营管理，有效缓解停车供给不足，实现停车规范有序、资源配置优化、群众出行畅通方便。因此，彻底解决停车难的问题势必要建地下停车场或露天停车场，但二者存在或建设成本较高，或占地面积较大的问题。而立体停车库因占地面积小、投资成本低、建设周期短成为解决当下问题的最佳途径。

2.项目立项情况

2019年7月16日，合水县发展和改革局下达《合水县发展和改革局关于<合水县智能停车场建设项目可行性研究报告>的批复》（合发改〔2019〕291号），同意该项目启动实施。

3.项目主要内容及投资估算

批复建设内容：计划新建地上七层、局部地下一层的钢框架结构机械式升降横移立体车库一处，总建筑面积1,140.16平方米，其中：地上建筑面积867.84平方米，地下消防水池建筑面积272.32平方米，设计停车位234个，硬化铺装面积604.00平方米，配套设施建设。

项目估算总投资：项目估算总投资3,232.00万元，其中：建安工程费用2,640.90万元，工程建设其他费用293.02万元，预备费234.71万元，建设期利息63.37万元。

项目资金来源：资金来源为申请地方政府专项债券资金2,500.00万元，不足部分由县级财政配套解决。

4.项目实施情况

经现场勘查，截止现场勘查结束，地下混凝土浇筑已完工，部分模板未拆除，地上部分钢框架结构安装至第四层，智能停车场设备及剩余型钢已运抵施工现场。

(二)项目绩效目标

合水县智能停车场建设项目绩效目标表

项目名称	庆阳市合水县智能停车场建设项目		
实施单位	合水县住房和城乡建设局		
项目属性	新建	项目建设期	18 个月
项目概况	该项目占地 3.66 亩，建筑总面积 7,382.78 平方米，其中地上建筑面积 7,078.46 平方米（共七层），地下建筑面积 304.32 平方米（共一层），建筑高度 18.95 米，设计停车位 234 个。入口广场硬化面积 750.00 平方米，道路硬化 380.00 平方米，绿化面积 420.00 平方米，属于 II 类汽车库。		
立项依据	《合水县发展和改革局关于<合水县智能停车场建设项目可行性研究报告>的批复》（合发改〔2019〕291 号）		
项目资金 (万元)	资金总额:		3,424.05
	财政资金		924.05
	专项债券		2,500.00
总体目标	有效缓解周边停车难、交通拥堵等问题，进一步促进城市交通与县域经济协调发展，扩大内需，提升居民生活幸福指数，不断加快城市化进程。		

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合相关政策
		立项程序规范性	项目立项符合程序
	前期工作	前期工作准备充分性	项目前期工作按计划完成
		前期工作开展规范性	项目前期工作符合程序
	资金投入	预算编制科学性	预算内容及投资额与项目内容匹配，并符合专项债券相关要求
	专项债券安排	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	项目符合地方政府专项债券资金支持范围
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目专项债券额度合理
	绩效目标	绩效目标合理性	项目绩效目标依据充分合理
		绩效指标明确性	项目绩效指标清晰、可衡量
管理	专项债券管理	专项债券预算管理规范性	专项债券纳入政府性基金预算管理
		专项债券资金实际成本	专项债券资金成本合理可控
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券本息偿还与原定计划的一致性
		项目收入、成本及预期收益合理性	项目收入、成本和预期收益测算依据完整
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	本息覆盖倍数 ≥ 1.20
		专项债券期限结构合理性	项目营运期限 $\geq$ 专项债券期限
	资金使用管	财政配套资金到位率	=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	理情况	资金使用率	=100%
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	与项目进度一致
		资金使用合规性	资金使用符合相关规定
	项目组织管理	项目管理制度健全性	项目管理制度合法、合规、完整
		项目管理规范性	项目管理实施与规定相符
		项目工期进度管理	项目进度符合预定目标
		外部监督发现问题整改情况	项目问题整改全面有效
		专项债券项目信息管理规范性	项目信息按要求进行公开
产出	建设产出数量	项目建设形成资产实际完成率	=100%
	建设产出质量	项目建设质量达标率	=100%
	建设产出时效	项目建设进度及时性	实际完成时间≤计划完成时间
	建设产出成本	项目建设成本节约率	实际成本≤计划成本
效益	项目综合效益	经济效益	总收入 9,675.32 万元
		社会效益	促进当地经济的发展、提高人民生活水平、促进社会和谐
		生态效益	加快城市建设步伐，改变老城区脏、乱、差城市面貌
	项目带动社会有效投资	社会有效投资带动度	引导带动社会有效投资情况
	项目支持国家级本市重大区域发展战略情况	国家及本市重大区域发展战略支持力度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持
	满意度	服务对象或项目收益人等相关群体满意度	≥98%

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

运用科学合理的方法，按照规范的程序，通过了解合水县智能停车场建设项目实施情况、预期目标的实现程度和实施效果，对政府专项债券项目资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判；为

未来规范同类项目管理和财政资金安排提供重要的参考依据。

(二)绩效评价对象

本次绩效评价对象是合水县智能停车场建设项目，截止2022年5月31日，该项目累计到位资金2,500.00万元，均为2021年下达的专项债券资金，其中一期债券资金2,100.00万元，二期债券资金400.00万元。

(三)绩效评价依据

1.政策依据

(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2)《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

(3)《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

(4)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(5)《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）；

(6)《地方政府专项债券用途调整操作指引》（财预〔2021〕110号）；

(7)《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》

（甘财预〔2021〕54号）；

（8）《甘肃省省级预算绩效管理办法》等六个办法和规程（甘财绩〔2020〕5号）；

（9）《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）。

2.评价依据

（1）项目可行性研究报告及批复等设立的政策依据文件资料；

（2）项目申请、专项债券申请资料、情况说明；

（3）项目中标通知书、项目合同、情况说明等执行资料；

（4）项目预算及预算执行情况、资金收付等财务资料；

（5）项目实施单位编制的绩效目标、绩效自评等资料；

（6）评价人员自行收集的如现场踏勘、社会信息等资料。

（四）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

1.科学规范

专项债券项目资金实行全生命周期绩效管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

此次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对合水县智能停车场建设项目绩效进行客观、公正的

反映。

2.协同配合

合水县财政局牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

本次绩效评价在单位自评的基础上，委托第三方机构实施展开。

3.公开透明

绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过对社会公开专项债券情况，提高专项债券资金使用效益。

4.激励约束

突出绩效管理过程的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理过程作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与政策调整、改进管理等实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

(五)评价指标体系

本次绩效评价分别从项目决策、管理、产出、效益四个方面对合水县智能停车场建设项目绩效情况进行综合分析。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分可根据不同评价内容设定。总分设置为100

分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

合水县智能停车场建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	前期工作	前期工作准备充分性	2	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。
		前期工作开展规范性	3	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与项目的建设目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	专项债券安排	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	2	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	2	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
管理 (40分)	专项债券管理	专项债券预算管理规范	3	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理，用以反映和考察财政部门对专项债券的预算管理情况。
		专项债券资金实际成本	2	专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。
		专项债券本息偿还计划执行情况	2	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致，用以反映和考核专项债券本息偿还的实际执行情况。
		项目收入、成本及预期收益合理性	2	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	2	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配，用以反映和考核项目收支平衡情况。
		专项债券期限结构合理性	2	专项债券的期限与项目期限是否匹配，用以反映专项债券期限结构确定的合理情况。
	资金使用管理情况	财政配套资金到位率	3	财政配套资金实际到位数与应到位数的比率，用以反映和考核财政配套资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		资金使用率	3	专项债券资金等项目预算资金是否按照计划使用，有无闲置情况，用以反映或考核项目资金的使用情况。
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	3	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配，用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。
		资金使用合规性	3	专项债券资金等项目预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	项目组织管理	项目管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		项目管理规范性	3	项目管理实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
		项目工期进度管理	3	项目是否按预定的工期实施，是否存在延误，用以反映和考核项目建设进度实施和控制情况。
		外部监督发现问题整改情况	3	项目在审计、监管核查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。
		专项债券项目信息管理规范性	3	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入，相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。
产出 (25分)	建设产出数量	项目建设形成资产实际完成率	7	项目建设形成的资产实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出数量目标的实现程度。
	建设产出质量	项目建设质量达标率	6	项目建设质量的达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出质量目标的实现程度。
	建设产出时效	项目建设进度及时性	6	项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目建设进度时效目标的实现程度。
	建设产出成本	项目建设成本节约率	6	完成项目计划建设目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本的节约和控制程度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
效益 (15分)	项目综合效益	经济效益	2	项目在当年及以后若干年持续形成的经济效益,以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益,用以反映和考核项目对经济效益带来的影响和效果。
		社会效益	2	项目在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、提高履职或服务效率等方面的社会效益,用以反映和考核项目对社会发展带来的影响和效果。
		生态效益	2	项目对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果,用以反映和考核项目对自然生态环境带来的影响和效果。
	项目带动社会有效投资	社会有效投资带动度	3	项目实施引导和带动的社会有效投资情况,用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。
	项目支持国家及本市重大区域发展战略情况	国家及本市重大区域发展战略支持度	3	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。
	满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	3	服务对象或项目受益人等相关群体对项目产出和效果的满意情况,用以反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。

(六)绩效评价方法

根据评价对象的具体情况,本次主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等进行绩效评价。

1.成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标,比较支出所产生的效益和付出的成本。

2.比较法

比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行的比较,综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

4.公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

(七)评价标准

根据合水县智能停车场建设项目事先制定的任务、目标、计划、预算等预计数据与项目实际效益情况对比分析，进行评价。

(八)绩效评价实施过程

1.项目前期调研

通过查阅合水县智能停车场建设项目的相关可行性研究报告、实施方案、管理制度等文件、对相关人员访谈，了解项目实施范围、组织方式、受托责任、内外部环境及相关方，确定绩效评价对象、内容和评价方法。

2.制定工作方案

(1)构建绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）的规定，参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《甘肃省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工

作规程》（甘财绩〔2020〕5号）有关要求和范例，从项目决策、管理、产出、效益四个方面构建绩效评价指标体系一级指标；二级、三级指标选用最具项目代表性的核心指标。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出过程导向，体现不同实施阶段差异性。本项目为在建项目，因此，侧重于管理和产出的评价，故管理和产出分值分别为40分和25分，决策和效益分值分别为20分和15分。

(2)确定访谈对象和访谈提纲

在初步了解合水县智能停车场建设项目情况后，针对项目实施内容和前期发现的问题，确定访谈对象，设计访谈提纲；为了解项目情况和成效取得背后的经验做法以及导致问题的各种成因，收集项目相关方的意见建议，为评价取得直接或间接的证据。

(3)确定工作方案

为及时、经济、高效的完成评价工作，根据前期调研获得的相关信息，针对合水县智能停车场建设项目的实施进度，结合项目的实际情况，确定了合水县智能停车场建设项目绩效评价工作计划，并完善绩效评价工作内容。

3.组织实施

(1)2022年6月24日绩效评价小组通过与合水县财政局沟

通衔接，初步了解项目情况。

(2)2022年6月25日与项目实施单位沟通，取得项目的立项过程、项目资金到位数额、到位时间、资金管理、项目产出等方面的资料，同时对财务资料进行核查，并与财政部门沟通绩效评价工作方案和评价指标体系，并根据讨论建议做出修订。

(3)2022年6月27日与项目实施单位、财政部门领导，共同对项目实施的情况进行现场勘查。

(4)2022年6月28日实施绩效评价、走访、面谈，深入了解项目情况。

4.分析评价及绩效打分

通过现场收集资料、实地勘查、走访相关人员等方式深入了解合水县智能停车场建设项目资金管理及使用情况、项目实施情况、项目达成效果情况，并依据经批准的评价指标体系进行分析评价，得出初步评价结论。由绩效评价小组对初步评价结论进行讨论并确定最终绩效评价结果，做到实事求是，客观公正。

5.撰写报告阶段

(1)数据整理分析

对项目评价实施阶段形成的资料进行整理分析，为撰写报告做准备。

(2)撰写报告初稿

根据数据整理分析结果，结合项目实际，提炼项目亮点，归纳问题、分析成因，提出相关建议，撰写报告，形成初稿。

(3)最终定稿

根据各方修改意见，完善报告内容，并最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效评分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	得分
	合计		100		93.4
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
	前期工作	前期工作准备充分性	2	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	2
		前期工作开展规范性	3	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	3
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与项目的建设目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2
	专项债券安排	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	2	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况	2
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	2	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	得分
				和考核项目绩效目标的明细化情况。	
管理（40分）	专项债券管理	专项债券预算管理规范性	3	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理，用以反映和考察财政部门对专项债券的预算管理情况。	1.5
		专项债券资金实际成本	2	专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	2
		专项债券本息偿还计划执行情况	2	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致，用以反映和考核专项债券本息偿还的实际执行情况。	2
		项目收入、成本及预期收益合理性	2	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	2
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	2	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配，用以反映和考核项目收支平衡情况。	2
		专项债券期限结构合理性	2	专项债券的期限与项目期限是否匹配，用以反映专项债券期限结构确定的合理情况。	2
	资金使用管理情况	财政配套资金到位率	3	财政配套资金实际到位数与应到位数的比率，用以反映和考核财政配套资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	0
		资金使用率	3	专项债券资金等项目预算资金是否按照计划使用，有无闲置情况，用以反映或考核项目资金的使用情况。	3
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	3	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配，用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。	3
		资金使用合规性	3	专项债券资金等项目预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3
	项目组织管理	项目管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3
		项目管理规范性	3	项目管理实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3
		项目工期进度管理	3	项目是否按预定的工期实施，是否存在延误，用以反映和考核项目建设进度实施和控制情况。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	得分
		外部监督发现问题整改情况	3	项目在审计、监管核查、巡视等工作被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	3
		专项债券项目信息管理规范性	3	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入，相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	3
产出（25分）	建设产出数量	项目建设形成资产实际完成率	7	项目建设形成的资产实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出数量目标的实现程度。	7
	建设产出质量	项目建设质量达标率	6	项目建设质量的达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出质量目标的实现程度。	6
	建设产出时效	项目建设进度及时性	6	项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目建设进度时效目标的实现程度。	6
	建设产出成本	项目建设成本节约率	6	完成项目计划建设目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本的节约和控制程度。	6
效益（15分）	项目综合效益	经济效益	2	项目在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益，用以反映和考核项目对经济效益带来的影响和效果。	2
		社会效益	2	项目在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、提高履职或服务效率等方面的社会效益，用以反映和考核项目对社会发展带来的影响和效果。	2
		生态效益	2	项目对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果，用以反映和考核项目对自然生态环境带来的影响和效果。	2
	项目带动社会有效投资	社会有效投资带动度	3	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	3
	项目支持国家及本市重大区域发展战略情况	国家及本市重大区域发展战略支持度	3	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	3
	满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	3	服务对象或项目受益人等相关群体对项目产出和效果的满意情况，用以反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	2.9

(二)评价结论


项目绩效评价得分**93.40**分，绩效评价等级“优”。

总体认为，合水县智能停车场建设项目为具有一定收益的公益性项目，符合专项债券支持领域；项目实施符合城市发展规划；实际建设内容与批复建设内容一致；项目资金使用基本合规；项目的实施对解决合水县停车难问题，缓解市内交通拥堵具有重要作用，对促进城市交通与县域经济协调发展，构建和谐社会，提升居民幸福指数具有重要的意义。

但与此同时，还存在项目绩效目标还需细化分解；专项债券收支情况未进行账务处理；项目前期勘察、设计等费用尚未支付等问题。

四、绩效评价指标分析


“合水县智能停车场建设项目”绩效评价得分情况，如下图所示：

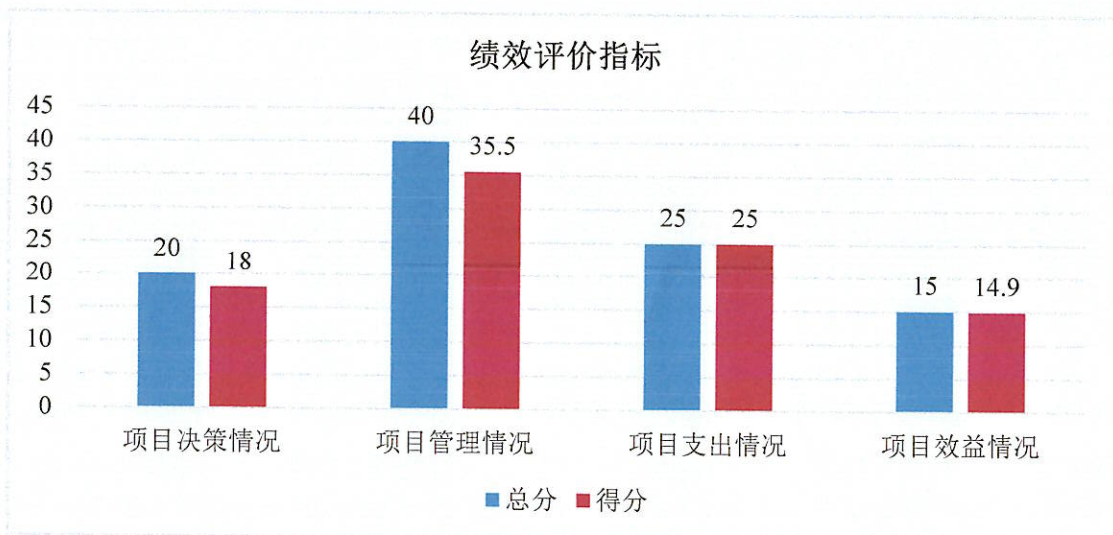

(一)项目决策情况（20分）

项目决策一级指标分值20分，得分为18分。

“合水县智能停车场建设项目”项目决策类各项具体指标得分情况如下图所示：

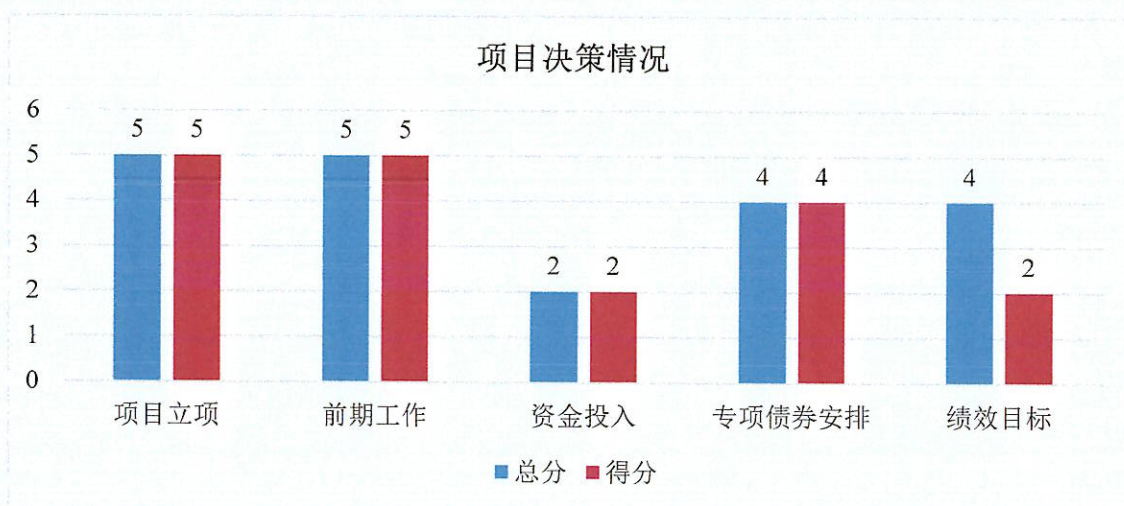

1.项目立项（5分）

(1)立项依据充分性（3分）

《中华人民共和国城乡规划法》《道路交通安全法》《关于加强城市停车设施建设的指导意见》（发改基础〔2015〕1788号）和《关于印发加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工的通知》（发改基础〔2016〕159号）以及《甘肃省城市停车场规划建设和管理暂行办法》、甘肃省发改委《关于加快城市停车场建设工作的通知》（甘发改交通〔2016〕257号）等法律、法规和政策文件为本项目的实施提供了政策依据。本项目的实施，符合“立足中心城市交通发展战略，以停车产业化为导向，着

眼当前、惠及长远，统筹推进城市综合交通体系和城市公共服务配套场（库）建设，加强运营管理，有效缓解停车供给不足，实现停车规范有序、资源配置优化、群众出行畅通方便”的政策导向和现实需求。

依据评分标准，该指标得3分。

(2)立项程序规范性（2分）

2019年7月16日，合水县发展和改革局下达《合水县发展和改革局关于<合水县智能停车场建设项目可行性研究报告>的批复》（合发改〔2019〕291号），同意该项目启动实施。批复的《可研报告》对项目的建设必要性及可行性、市场分析与建设规模、建设条件及建设位置、工程方案设计等前期准备工作进行充分论证。批复同时指出，该项目的实施将进一步促进城市交通与县域经济协调发展，扩大内需，提升居民生活幸福指数，不断加快城市化进程。

评价认为，本项目立项符合《政府投资条例》及《甘肃省政府投资管理办法》等相关规定，立项程序规范。

依据评分标准，该指标得2分。

2.前期工作（5分）

(1)前期工作准备充分性（2分）

本项目的可行性研究报告对项目的建设必要性及可行性、市场分析与建设规模、建设条件及建设位置、工程方

案设计等前期准备工作进行充分论证，并于2019年7月16日取得《合水县发展和改革局关于<合水县智能停车场建设项目可行性研究报告>的批复》（合发改〔2019〕291号），同意建设本项目。

2021年8月30日合水县发展和改革局下发《合水县发展和改革局关于<合水县智能停车场建设工程初步设计>的批复》，对工程的建设规模、工程设计、建筑设计、结构设计、工程概算等进一步明确。

项目前期批复、用地、规划及施工许可证等具体情况如下：

序号	文件/证件	文号/编号	下达单位	下达日期
1	项目可研批复	合发改〔2019〕291号	合水县发展和改革局	2021/7/16
2	建设用地规划许可	地字第621024202100009号	合水县自然资源局	2021/8/24
3	项目初设批复	合发改审〔2019〕84号	合水县发展和改革局	2021/8/30
4	建设工程规划许可	建字第621024202100016号	合水县自然资源局	2021/8/30
5	建筑工程施工许可	621024202202110102	合水县住房和城乡建设局	2022/2/11

评价认为，本项目前期工作准备比较充分。

依据评分标准，该指标得2分。

(2)前期工作开展规范性（3分）

本项目前期工作开展情况如下：

序号	合同	中标公告	合同签订	合同单位	合同金额 (万元)	备注
1	勘察合同		2021/6/3	甘肃华圣建设工程有限公司	1.80	限额以下未公开招标
2	设计合同	2021/8/16	2021/8/24	首辅工程设计有限公司	68.60	
3	监理合同	2021/10/22	2021/12/6	甘肃鑫海建设监理咨询有限公司	49.80	
4	施工合同	2021/10/22	2021/12/3	陕西泽恩建筑工程有限公司	2.959.99	

评价认为，本项目开展前期工作合法规范。

依据评分标准，该指标得3分。

3.资金投入（2分）

本项目预算由汇丰国际项目管理有限公司编制，施工图预算为2,960.34万元，初步设计批复中工程费用的概算投入资金为2,965.65万元，预算资金低于项目概算；项目合同价为2,959.99万元，低于项目施工图预算。项目预算投资额与项目建设目标相适应。

依据评分标准，该指标得2分。

4.专项债券安排（4分）

(1)项目与专项债券支持领域及方向匹配性（2分）

本项目2021年新增政府专项债券资金2,500.00万元，分两批下达，其中《甘肃省财政厅关于下达2021年第一批新增政府债券额度的通知》（甘财预〔2021〕36号）下达资金2,100.00万元，《甘肃省财政厅关于下达2021年新增政府债务额度的通知》（甘财预〔2021〕63号）下达资金400.00万。本项目符合当年地方政府专项债券的支持领域和方向。

依据评分标准，该指标得2分。

(2)项目申请专项债券额度与实际需要匹配性（2分）

本项目估算总投资3,232.00万元，资金来源为申请地方政府专项债券资金2,500.00万元，不足部分由县级财政配套解决。专项债券资金占估算总投资的77.35%，专项债券申

请额度与实际需要相匹配。

截止2022年5月31日，2021年新增政府专项债券资金2,500.00万元已全部用于项目建设。

依据评分标准，该指标得2分。

5.绩效目标（4分）

(1)绩效目标合理性（2分）

项目整体规划和相关说明较充分，项目实施的可行性和项目计划较完善。但绩效指标还不够细化，与《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的要求尚有一定差距。

依据评分标准，该指标得1分。

(2)绩效指标明确性（2分）


本项目总体目标与部门长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体明确，但未将总体绩效目标分解为具体可执行绩效指标，对绩效指标的衡量度较低

依据评分标准，该指标得1分。

(二)项目管理情况（40分）

项目决策一级指标分值40分，得分为35.5分。

“合水县智能停车场建设项目”项目管理类各项具体指标得分情况如下图所示：

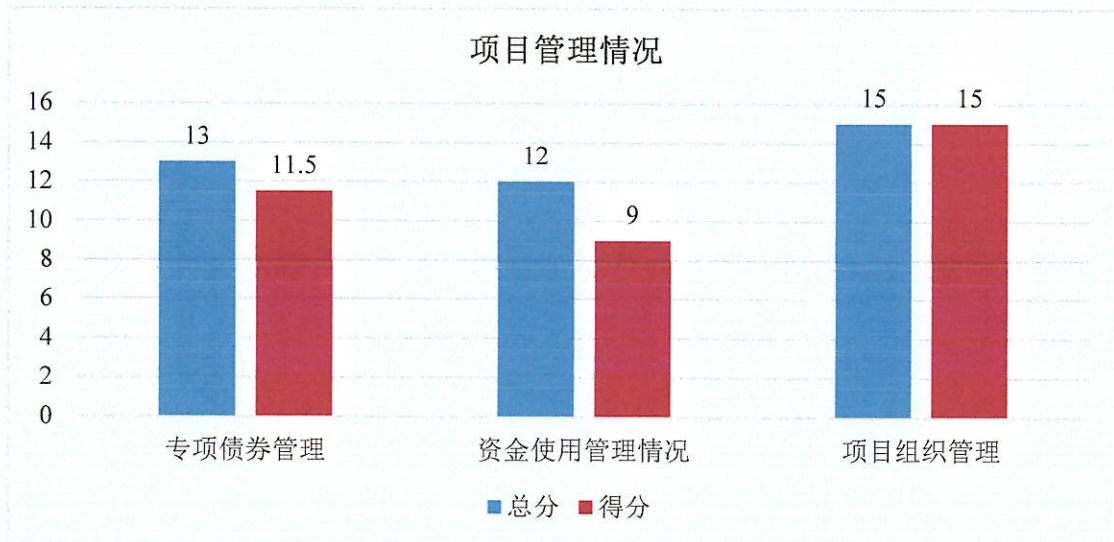

1.专项债券管理（13分）

(1)专项债券预算管理规范性（3分）

本项目专项债券收支、还本付息和专项收入已纳入政府性基金预算管理，对资金的收支管理比较规范，但截止现场勘查结束，项目单位只对专项债券资金收支凭证进行了归集整理，未及时进行账务处理，不利于项目检查和资金监管。

依据评分标准，该指标得1.5分。

(2)专项债券资金实际成本（2分）

《2021年甘肃省政府专项债券（九期）——合水县智能停车场建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（甘广合会咨〔2021〕第043号）中债券预计利率3.88%，本项目专项债券利率实际为3.54%。债券成本总体合理可控。

依据评分标准，该指标2分。

(3)专项债券本息偿还计划执行情况（2分）

本项目2021年新增政府专项债券资金2,500.00万元，根据《2021年甘肃省政府专项债券（九期）——合水县智能停车场建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（甘广合会咨〔2021〕第043号），债券本息覆盖倍数为1.63，债券利息每年付息一次，专项债券利息按照计划执行。2022年债券利息已列入“合水县2022年财政支出预算”。由于本项目还处于在建阶段，项目收入计提及收缴财政的制度机制尚未建立。

依据评分标准，该指标得2分。

(4)项目收入、成本及预期收益合理性（2分）

《2021年甘肃省政府专项债券（九期）——合水县智能停车场建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（甘广合会咨〔2021〕第043号）对本项目的收入、成本和收益与融资平衡进行了测算，项目测算依据充分，并符合实际情况。

依据评分标准，该指标得2分。

(5)项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性（2分）

根据《2021年甘肃省政府专项债券（九期）——合水县智能停车场建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（甘广合会咨〔2021〕第043号），预计本

项目在债券存续期内项目收入为9,675.32万元，项目成本为6,892.50万元，项目收益可覆盖专项债券本息。项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配度较高。

依据评分标准，该指标得2分。

(6)专项债券期限结构合理性（2分）

本项目运营期为20年，债券存续期20年，截止2041年偿还本息后，累计净现金结余2,854.12万元，静态回收期12.90年，专项债券与项目建设和运营期限相匹配。

依据评分标准，该指标得2分。

2.资金使用管理情况（12分）

(1)财政配套资金到位率（3分）

截止2022年5月31日，以债券资金向施工单位支付本项目工程款2,500.00万元。但项目勘察费用、前期设计费用、监理费用均未支付，不符合党中央、国务院关于清理拖欠民营企业账款相关规定。

合同酬金支付情况如下：

序号	合同	合同金额 (万元)	约定支付情况	应支付金额(万元)	实际支付金额(万元)
1	勘察合同	1.80	勘察报告通过施工图审查后一次性付清	1.80	0
2	设计合同	68.60	签约后付款30%，工作完成付款70%	68.60	0
3	监理合同	49.80	预付款30%，主体完工时付款50%，竣工验收后付款15%，相关服务期满14天内付款5%	14.94	0
合计		120.20		85.34	0

依据评分标准，该指标得0分。

(2)资金使用率（3分）

本项目建设施工费支出2,500.00万元，其中：2022年2月支付887.00万元，2022年4月支付592.00万元，2022年5月支付1,021.00万元，资金按计划使用，未发现资金闲置情况。

依据评分标准，该指标得3分。

(3)资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性（3分）

本项目中标价2,959.99万元，截止2022年5月31日，共支付进度款2,500.00万元，总支付进度为84.46%。支付详见下表：

序号	资金审核批准时间	支付金额（万元）	支付比例	款项性质	备注
1	2021/12/22	887.00	29.60%	预付款	
2	2022/3/14	592.00	20.00%	进度款	
3	2022/5/17	590.00	19.93%	进度款	
4	2022/5/27	431.00	14.56%	进度款	

截止现场勘查结束，钢结构已安装至第四层（共七层），剩余型钢在场地内堆放，设备已进场。项目实际进度与资金支付进度基本一致。

依据评分标准，该指标得3分。

(4)资金使用合规性（3分）

本项目专项债券资金使用中未发现违反国家财经法规和财务管理制度的现象，未发现不符合资金使用项目预算批复和专项债券有关规定的现象，未发现资金存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，该指标得3分。

3.项目组织管理（15分）

(1)项目管理制度健全性（3分）

本项目的实施单位制定了完善的专项债券财务管理制度和项目管理制度，且未发现财务和业务管理制度有违法、违规和不完整的情况。各项规范、制度对项目的顺利实施有较好的保障。

依据评分标准，该指标得3分。

(2)项目管理规范性（3分）

本项目的实施遵守相关法律法规和管理规定，项目前期资料、项目中标通知书、项目合同书、技术鉴定等各类资料齐全，且按要求归档，项目实施的人员条件、监管核查信息支撑等均落实到位。

依据评分标准，该指标得3分。

(3)项目工期进度管理（3分）

本项目合同工期为2022年3月15日至2022年12月12日，工期总日历天数272天。截止现场勘查结束，地下部分混凝土结构已施工完毕，地上钢架结构安装工程施工至第四层（共七层），未发现项目有逾期的迹象。

依据评分标准，该指标得3分。

(4)外部监督发现问题整改情况（3分）

本项目截止2022年5月31日，在审计、监管核查、巡视等工作中未被检查出问题。

依据评分标准，该指标得3分。

(5)专项债券项目信息管理规范性（3分）


经了解，本级财政部门在地方政府债务管理信息系统中，对地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整的录入和更新，相关项目信息按照政府信息公开的有关规定在相关网站平台上予以公开。

依据评分标准，该指标得3分。

(三)项目产出情况（25分）

项目决策一级指标分值25分，得分为25分。

“合水县智能停车场建设项目”项目产出类各项具体指标得分情况如下图所示：

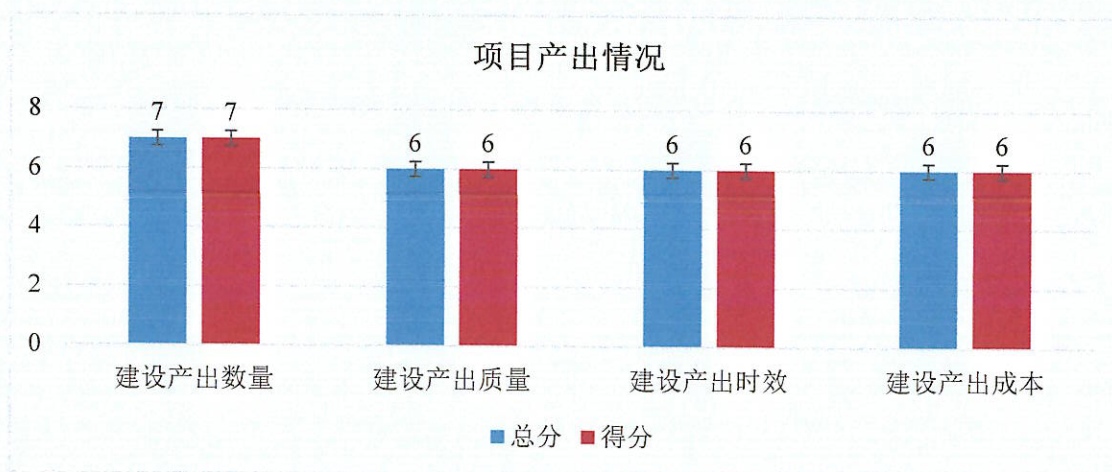

1.建设产出数量（7分）

本项目批复建设地上七层（局部地下一层）钢框架结构机械式升降横移立体车库一处，总建筑面积1,140.16平方

米，其中地上建筑面积867.84平方米，地下消防水池建筑面积272.32平方米，设计停车位234个，硬化铺装604.00平方米，及停车库配套设施建设。

截止现场勘查结束，项目建设形成资产实际产出与计划产出基本一致。

依据评分标准，该指标得7分。

2.建设产出质量（6分）

本项目施工期间，除监理驻场对施工质量进行把关外，合水县住房和城乡建设局还下达《合水县住房和城乡建设局关于印发<进一步推进重点项目“四个三”工作机制的实施意见>的通知》（合建发〔2019〕45号）及《合水县住房城乡建设局关于印发<2022年重点建设项目包抓方案>的通知》（合建发〔2022〕71号）文件，根据文件精神，将项目分配至包抓领导和包抓责任人，实施“三个一”责任包抓机制、“三个一”协调推进机制、“三个”质量保障组、“三项”督导机制的“‘四个三’工作机制”，保质保量完成建设项目。截止现场勘查结束，根据我们了解的情况与监理日志等佐证资料，已完工程部分未发现项目质量存在问题。

依据评分标准，该指标得6分。

3.建设产出时效（6分）

2022年2月11日合水县住房和城乡建设局出具了《建筑

工程施工许可证》（编号：621024202202110102），同时下达了开工令，工程施工随即展开，目前施工进度与计划进度相符，预计施工将按原计划竣工。

依据评分标准，该指标得6分。

4.建设产出成本（6分）


本项目可行性研究报告批复项目估算总投资3,232.00万元，工程初步设计批复项目总概算3,424.05万元。项目勘察、设计、监理及施工的合同价为3,080.19万元，项目实际总投资成本未超出本项目的投资概算。

依据评分标准，该指标得6分。

(四)项目效益情况（15分）

项目决策一级指标分值15分，得分为14.9分。

“合水县智能停车场建设项目”项目决策类各项具体指标得分情况如下图所示：

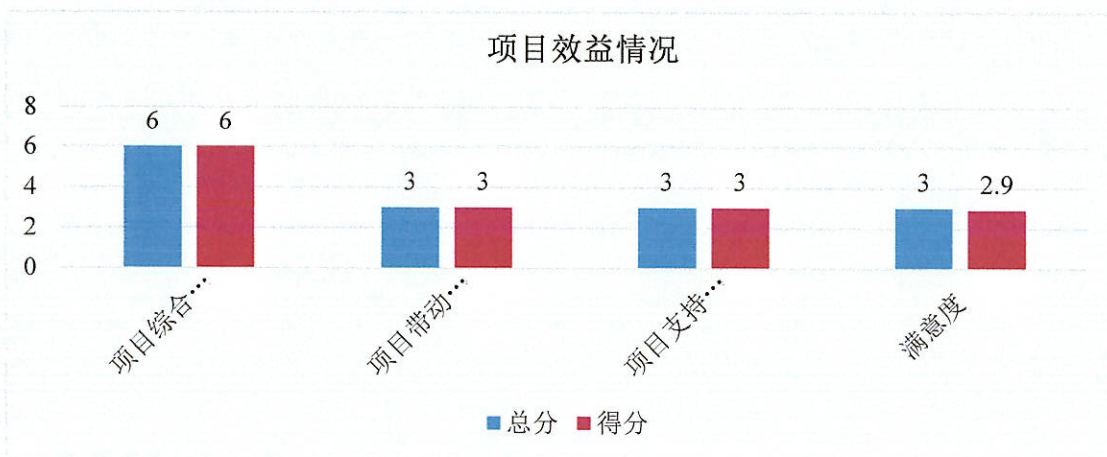

1.项目综合效益（6分）

(1)经济效益（2分）

根据《2021年甘肃省政府专项债券（九期）——合水县智能停车场建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（甘广合会咨〔2021〕第043号），预计本项目在债券存续期内可带来直接经济效益9,675.32万元，同时，项目的建设带动建材、运输、施工、餐饮、酒店等相关行业的发展，并且提供了大量的就业机会，增加当地人均收入，对当地经济发展有一定的促进作用，间接产生较好的经济效益。

依据评分标准，该指标得2分。

(2)社会效益（2分）

该项目的建成将有效缓解周边停车难、交通拥堵等问题，促进城市交通与县域经济协调发展，改善民生，提高居民幸福指数，推动经济社会又好又快发展。

依据评分标准，该指标得2分。

(3)生态效益（2分）

本项目的建设大多采用钢结构，减少了高耗能高污染的水泥的用量，同时减少了施工产生的粉尘；项目建成后，缓解了交通拥堵问题，从而减少燃油消耗，间接带来了生态效益。

依据评分标准，该指标得2分。

2.项目带动社会有效投资（3分）

项目的建设改善了当地基础设施条件，一定程度上可

以带动二、三产业发展，拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业，同时也是扩大居民消费的有效途径，从而实现可持续发展，加快合水县城城市化步伐。

依据评分标准，该指标得3分。

3.项目支持国家及本市重大区域发展战略情况（3分）

本项目的实施，符合当地“十四五”规划中城镇基础设施改造的要求，对县域经济社会高质量发展提供了有力的支撑，对本区域及周边地区的发展有重大意义。

依据评分标准，该指标得3分。

4.满意度（3分）

通过对项目立项、主管、监管单位、项目监理的走访，各方对本项目实施和管理方面均予充分肯定；对当地群众进行了随机的问卷调查，共获得24份调查问卷，群众的预期评价较高，项目没有产生相关的负面信息。综合群众对该项目进行了打分，平均分为95分。

依据评分标准，该指标得2.9分。

五、主要经验及做法及存在的问题

(一)主要经验及做法

1. 本项目实施单位针对建设项目专门发布文件，制定了“四个三”的项目推进机制，对每一个项目都指定了包抓领导，明确了重点项目管理职责，保证了项目施工进度，提高了建设工程的质量和水平。

2.本项目实施过程中，严格执行专项债券资金使用的各项规范制度，在评价过程中未发现违法财经法规及其他违纪行为。

3.本项目能够按照要求进行科学决策，前期准备工作充分，招标手续完备、规范，项目建设程序完整，建设过程中制度建设科学合理，项目档案管理细致、无缺失。

(二)存在的问题

1.项目绩效目标还需细化分解。评价发现，项目单位在申请专项债券时，绩效目标设置不够细化，衡量度较低。不符合《甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）第七条关于“绩效目标应当重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标”的相关规定。

2.专项债券收支情况未进行及时账务处理。评价发现，截止现场勘查结束，项目单位只对专项债券资金收支凭证进行了归集整理，未及时进行账务处理，不利于项目检查和资金监管。

3.存在拖欠项目前期费用问题。评价发现，截止现场勘查结束，项目单位共计拖欠勘察、设计、监理等项目费用85.34万元，不符合党中央、国务院关于清理拖欠民营企业账款相关规定。

六、有关建议

1.尽快按照政策要求完善项目绩效目标，对绩效目标的设计应依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符，并清晰可衡量。

2.对项目归集的资金收支及还本付息的财务资料尽快进行账务处理，并设置单独科目进行核算，对项目财务状况进行全面管理。

3.及时支付项目的各项前期费用，杜绝产生拖欠民营企业账款的情况。

七、其他需要说明的问题

(一)抽样调查的局限性

受本次绩效评价业务时间及其他方面因素的限制，项目组在当地随机对建设单位工作人员、当地群众进行了问卷调查，共计获取调查问卷24份，平均打分为95分。由于对当地群众未能全覆盖，评价单位不能确定其他未被抽样的群众是否存在不满意的方面。但根据抽样推断的理论基础，未被抽样的其余群众大概率会与本次抽样结果一致，但细节上或有差异。

(二)本次绩效评价的局限性

本次绩效评价中，我们查阅了项目单位及相关方面提供的文件资料及财务资料，对工项目建设情况进行了实地

勘察，但绩效评价工作既不同于专项审计，也并非对项目工程质量、数量等进行验收及结算审核，加之工作条件等客观因素，难免存在未关注到的细微环节。

附件：

- 1.地方政府专项债券项目资金绩效评价指标及评分表共1页
- 2.社会调查问卷共1页
- 3.项目部分佐证资料共49页
- 4.项目现场掠影共1页

甘肃天一会计师事务所有限公司



合水县智能停车场建设项目资金绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	合计		100	93.4
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	前期工作	前期工作准备充分性	2	2
		前期工作开展规范性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	2	2
	专项债券安排	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	2	2
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1
		绩效指标明确性	2	1
管理（40分）	专项债券管理	专项债券预算管理规范性	3	1.5
		专项债券资金实际成本	2	2
		专项债券本息偿还计划执行情况	2	2
		项目收入、成本及预期收益合理性	2	2
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	2	2
		专项债券期限结构合理性	2	2
	资金使用管理情况	财政配套资金到位率	3	0
		资金使用率	3	3
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	3	3
		资金使用合规性	3	3
	项目组织管理	项目管理制度健全性	3	3
		项目管理规范性	3	3
		项目工期进度管理	3	3
		外部监督发现问题整改情况	3	3
		专项债券项目信息管理规范性	3	3
产出（25分）	建设产出数量	项目建设形成资产实际完成率	7	7
	建设产出质量	项目建设质量达标率	6	6
	建设产出时效	项目建设进度及时性	6	6
	建设产出成本	项目建设成本节约率	6	6
效益（15分）	项目综合效益	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
	项目带动社会有效投资	社会有效投资带动度	3	3
	项目支持国家及本市重大区域发展战略情况	国家及本市重大区域发展战略支持度	3	3
	满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	3	2.9

合水县智能停车场建设项目调查问卷

1. 您的车牌号:
2. 所驾驶的 vehicle 为: ☐ 轿车 ☐ SUV ☐ 其他
3. 您是否对合水县修建智能停车场有所了解: ☐ 了解 ☐ 不了解
4. 若停车场建好, 您是否会选择停车: ☐ 会 ☐ 不会
5. 您认为停车场开始运营后对改善城市“停车难”是否有所帮助: ☐ 是 ☐ 否
6. 您对修建智能停车场有什么意见或建议:
7. 若您为该智能停车场进行综合评价打分, 你的打分:
(90-100分为优秀, 80-89为良, 60-79为中, 60以下为差)



统一社会信用代码证书

统一社会信用代码 11621024013953572K

机构名称 合水县住房和城乡建设局（合水县人民防空办公室）

机构性质 机关

机构地址 合水县惠民巷72号

负责人 薛恒义



赋码机关



颁发日期 2021年06月15日

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制





甘肃省财政厅文件

甘财预〔2021〕36号

甘肃省财政厅关于下达2021年第一批 新增政府债券额度的通知

各市（州）、兰州新区财政局，省直管县（市）财政局，省直相关部门（单位）：

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快地方政府债券发行使用进度，尽早发挥债券资金对全省经济的拉动作用，现就2021年第一批新增政府债券额度有关事项通知如下：

一、2021年第一批新增政府债券额度。经省政府同意，并依法向省人大常委会备案，现下达你地区（部门）2021年第一批新增政府债券额度（详见附件）。



二、加快债券资金使用进度。债券发行后，各级财政部门要尽快将资金拨付到项目上，并督促项目主管部门尤其是项目单位加快支出进度，防止债券资金滞留国库，或沉淀在主管部门及项目单位。要加强与发改等相关部门的协调配合，确保债券资金投入使用后能尽早形成实物工作量，有效发挥债券资金对经济的拉动作用。

三、加强债券资金使用管理。严禁将新增债券资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。新增债券资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴等。各级财政部门要依托地方政府债务管理信息系统，对专项债券使用实行穿透式、全过程监控，动态监测债券项目各类参与主体，逐个环节跟踪债券使用进度。同时，压实项目主管部门及项目单位主体责任，坚持“举债必问效，无效必问责”，提高债券资金使用绩效，确保项目质量，决不能乱花钱。

四、严格落实债券资金偿付责任。按照“借、用、管、还”相统一的地方政府债务管理制度，严格落实偿债主体责任。各级财政部门要强化预算管理，将债券本息足额纳入预算，并督促专项债券项目单位及主管部门及时将项目对应的政府性基金收入或



专项收入上缴同级财政，优先用于专项债券本息偿付，避免出现债券违约事件，切实维护政府信誉。

五、健全通报约谈机制和监督机制。省财政厅将建立定期通报制度，每月对债券资金拨付使用情况进行统计监测，对资金拨付使用进度慢、违规使用债券资金的地区或部门予以通报或约谈，情节严重的扣减或不安排新增债券。

附件：1. 2021 年第一批新增政府债券分地区额度表（分发市县）

2. 2021 年第一批新增专项债券省级项目安排表（分发省直有关部门）



2021年第一批新增政府债券分地区额度表

单位：亿元

地区	合计	一般债券	专项债券
合水县	1.2	0	1.2



2021年合水县第一批专项债项目安排表

单位: 万元

地区	区划编码	项目名称	总投资	债券需求	安排金额
合计			41545	25176	12000
合水县	621024	合水县殡仪馆建设项目	5000	4000	500
合水县	621024	合水县黄河象大剧院建设项目	13600	10000	3600
合水县	621024	合水县智能停车场项目	3232	2500	2100
合水县	621024	合水县人民医院医疗诊治能力提升建设项目	6054	3500	3100
合水县	621024	合水县职业中等专业学校学生宿舍建设项目	3470	2776	2700



甘肃省财政厅文件

甘财预〔2021〕63号

甘肃省财政厅关于下达 2021 年 新增政府债务限额的通知

各市（州）、省直管县财政局，兰州新区财政局：

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快地方政府债券发行使用进度，提高资金使用效益，保障重点项目资金需求，更好发挥积极的财政政策，经省政府同意，现就下达 2021 年新增政府债务限额及有关事项通知如下：

一、下达 2021 年新增政府债务限额



经省政府同意，下达你地区 2021 年新增政府债务限额（不含政府外债转贷限额，全年外债转贷限额待确定后另行通知），具体额度见附件。请你局将限额下达情况及时向本级政府主要负责同志报告。

二、严格履行法定程序

市县财政部门要根据省级下达的新增债务限额，将举借新增债务事项编入预算，由本级政府报经同级人民代表大会或其常务委员会批准后执行。

三、落实债券使用要求

各地区要坚持将新增债券资金依法用于公益性资本支出，按照“资金跟着项目走”的原则，尽快将本次下达债券额度对应到具体建设项目。专项债券必须是国家发改委和财政部共同审核通过的项目，必须是有一定收益的公益性项目，融资规模要与项目收益相平衡，必须满足专项债券发行管理和风险防控条件。优先支持党中央、国务院和省委、省政府确定的重大战略、重点领域项目，重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域，优先支持在建项目。



一般债券要将小型水库额度足额安排用于小型水库除险加固、小型水库维修养护、水库雨水情测报和安全监测设施完善项目，不得调整到其他项目，必须当年使用完毕，不得结转；其他一般债券额度要优先用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以及落实省委、省政府确定的十件为民办实事事项。

严禁将新增债券资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。新增债券资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，不得用于偿还债务，不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目。严禁用于商业化运作的产业项目，严禁用于企业注册资本金、补贴等。

四、加快债券发行使用进度

你局要尽快将新增债券额度对应到具体项目，抓紧做好专项债券发行准备工作，加快三方机构项目评估审核进度，决不允许出现因新增专项债券未能成功发行影响重大项目进展情况。同时，严格按照《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》要求，督促指导同级项目主管部门和项目单位开展专项债券项目绩效评估相关工作，事前绩效评价结果未通过审核的项目，不得安



排专项债券。具体项目安排情况需报省财政厅和省发展改革委备案，并于9月3日之前将专项债券相关发行资料报送省财政厅。新增债券资金下达后，各级财政部门要加快债券资金拨付，督促主管部门和项目单位落实管理责任，原则上发行后1个月内应当全部拨付到项目上，严禁将债券资金滞留国库或沉淀在部门单位，确保尽早形成支出，促进本地区经济健康平稳运行。

附件：2021年新增政府债务限额表



公开属性：依申请公开

印发单位：甘肃省财政厅

2021年8月30日印发

共印10份



下达2021年甘肃省新增地方政府债务限额表（分发县区）

单位：亿元

编码	地区	一般债务			专项债务		
		合计下达	已下达	本次下达 其中：小型 水库额度	合计下达	已下达	本次下达
00200900	合水县	0.4000	0.0000	0.4000	3.2000	1.2000	2.0000



2021年合水县第二批专项债项目安排表

单位: 万元

地区	区划编码	项目名称	项目投向 (所属行业)	项目投向 2	总投资	债券需求	第二批建议安 排
合计					167666	55721	20000
合水县	621024	合水县殡仪馆建设项目	0605其他 社会事业	1399其他 社会保障	5000	4000	2000
合水县	621024	合水县黄河象大剧院建设项目	0605其他 社会事业	0499其他 市政建设	13600	10000	5500
合水县	621024	合水县城区集中供热扩建及管网改造工程	0605其他 社会事业	0499其他 市政建设	10189	2400	500
合水县	621024	合水县智能停车场项目	0206城市 停车场	0406停车 场建设	3232	2500	400
合水县	621024	合水县人民医院医疗诊治能力提升建设项目	060102公 共卫生设	1201公立 医院	6054	3500	400
合水县	621024	合水县城中村棚户区改造安置房(阳光苑)项目	0903棚 户区改	0604棚 户区改	72144	7600	7600
合水县	621024	甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目	0604文 化旅游	1101文 化旅游	24234	10000	3600





合水县发展和改革局文件

合发改〔2019〕291号

签发人：丑公峰

合水县发展和改革局 关于《合水县智能停车场建设项目可行性 研究报告》的批复

县住建局：

你局关于上报《合水县智能停车场建设项目可行性研究报告》的报告（合建发〔2019〕240号）收悉。经委托甘肃和诚工程咨询设计有限公司组织专家对首辅工程设计有限公司编制的《合水县智能停车场建设项目可行性研究报告》进行评审，编制单位根据审查意见对该可行性研究报告进行了修改，修改后的可行性研究报告基本达到了国家规定的深度要求。依据甘肃和诚工程咨询设计有限公司的咨询评估意见（甘和诚评估〔2019〕42号），现就有关事宜批复如下。



扫描全能王 创建



一、项目名称

合水县智能停车场建设项目

二、建设单位

合水县住房和城乡建设局

三、建设地址

合水县城北区，北邻广场路，东邻成业路，与合水县政务服务中心斜对。

四、建设项目的必要性

随着城市面积的不断扩大，机动车拥有量、客货运输量增长迅速，且县城秦直路以东，古象路以南，成业路以西、广场路以北的区域内已建成县统办大楼、公安局、人社局、妇幼保健院及消防中队和政务服务中心等多个集中办公地点，为有效解决周边停车难问题，因此本项目的建设是十分有必要的。

五、建设内容及规模

计划新建地上七层（局部地下一层）钢框架结构机械式升降横移立体车库一处，总建筑面积 1140.16 平方米，其中：地上建筑面积 867.84 平方米，地下消防水池建筑面积 272.32 平方米，设计停车位 234 辆，硬化铺装面积 604 平方米，配套设施建设。

六、项目估算总投资及资金来源

项目估算总投资 3232 万元，其中：建安工程费用 2640.9 万元，工程建设其他费用 293.02 万元，预备费 234.71 万元，



建设期利息 63.37 万元。资金来源为申请地方政府专项债券资金 2100 万元，不足部分县级财政配套解决。



七、经济效益及社会效益

该项目建成后，将有效缓解周边停车难、交通拥堵等问题，进一步促进城市交通与县域经济协调发展，扩大内需，提升居民生活幸福指数，不断加快城市化进程。

八、项目代码

2019-621024-48-01-012238

九、项目节能


在项目设计及建设过程中严格按照中华人民共和国国家标准 GB50189-2005 公共建筑节能设计标准执行，优化和完善节能措施。

望接文后，尽快委托有资质的单位进行初步设计，抓紧做好项目前期工作，积极落实建设资金，争取早日开工建设，充分发挥效益。

附件：合水县智能停车场建设项目招标表

合水县发展和改革局

2019 年 7 月 16 日



合水县发展和改革局

2019 年 7 月 16 日印发

(共印 10 份)



附表

合水县智能停车场建设项目招标表



项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
工程监理	√			√	√		
其他							

审批部门意见说明：

本工程设计、建安、监理、主要设备及重要材料等单位的选择，必须委托具有相应资质的招标代理机构进行公开招标。



合水县住房和城乡建设局文件

合建发〔2022〕71号

合水县住房和城乡建设局 关于印发《2022年重点建设项目包抓 方案》的通知

机关各股室，局属各单位：

《合水县住建局 2022 年重点建设项目包抓方案》已经局党组会议研究同意，现印发你们，请各项目包抓领导和包抓责任人严格按照《关于进一步推进重点建设项目“四个三”工作机制的实施意见》（合建发〔2019〕45号）文件精神，认真抓好贯彻落实，确保按期完成建设任务。

附：2022 年重点建设项目包抓责任表

合水县住房和城乡建设局

2022 年 3 月 18 日



合水县住建局2022年重点建设项目领导包抓分工表

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	进度进展要求	责任领导	包抓干部
续建项目						
1	合水县西华南街拓宽改造工程	道路长为616米，宽34米，主体工程为道路工程，给水工程；附属工程包括市政道路照明工程、通信工程、道路绿化工程及道路交通工程。	1512.2	3月底前完成建设	郭学超	姜娟 门小强
2	合水县富康西路拓宽改造工程	道路长271.6米，宽24米，包含道路工程、给排水工程、通讯照明工程、绿化工程、交通工程及其附属工程	462	4月底底前完成建设	赵宝平	杨永盛 温广平
3	合水县经一路（纬四路至纬五路）道路工程	道路长485.346米，宽24米，包含道路工程、给排水工程、通讯照明工程、绿化工程、交通工程及其附属工程	971	5月底前完成建设	安文涛	陈远承 拓小平
新建项目						
1	南北街拓宽及南街延伸绿化工程	西华北街拓宽改造段，绿化1197平方米，土方换填3313.62平方米，栽植乔木276棵，栽植灌木239株，安装600高铁艺护栏1600.2米；西华南街拓宽改造段，绿化2484.8平方米，土方换填2236.32平方米，栽植乔木619棵，栽植灌木566株，安装600高铁艺护栏3743.8米；西华南街道路延伸段，绿化48908.8平方米，土方换填33438.96平方米，栽植乔木4290棵，栽植灌木4287株；	3461.57	3月下旬开工，5月底完成建设	张斌	贾大伟 别海龙
2	黄河象大剧院建筑设计工程	项目占地48.33亩，总建筑面积15076平方米，其中地下建筑面积525平方米，地上建筑面积14551平方米，涵盖剧院区、青少年活动中心、民俗馆展示区等11个区域建设。	18560	3月初开工建设，11月底完成主体建设	安文涛	严社伟 司龙尤 李涛涛 陈远承 吕丽



合水县住建局2022年重点建设项目领导包抓分工表

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	进度进展要求	责任领导	包抓干部
3	环城西路基础设施配套工程	道路全长4188.52米，红线宽36米，断面采用三幅路形式，单侧人行道宽3米，非机动车道宽2.5米，机非分隔带宽1.5米，机动车道宽11米。新建给水管道3976米，雨水管道7184米，污水管道4483米，热力管道2704×2米，七孔梅花通信管15200米，强电杆线4280×4米，110PVC波纹管通信管19000米，MPP110管2800米，安装路灯200套。	17183.73	6月份开工建设，2023年10月底完成建设	安文涛	严社伟 司龙涛 李涛涛 陈远承 吕丽丽
4	智能停车场建设工程	项目占地3.66亩，总建筑面积7382.98平方米（地上建筑面积7078.46平方米，地下建筑面积304.32平方米），地上7层，建筑高度19.95m，设计停车位234辆，硬化铺装面积为1130平方米，绿化320平方米。	2959.98	11月底完成建设	郭学超	姜娟 门小强 宫瑶 别海龙
5	合水县北区排涝工程	铺设DN1000钢筋混凝土II级管1612米，铺设DN800钢筋混凝土II级管2166米，检查井128座，配套建设支管网。	2600	6月初开工，11月底完成建设	郭学超	姜娟 门小强 宫瑶 别海龙
6	合水县工业集中区基础设施建设项目（富康路至文化路）拓宽改造工程	道路长440米，红线宽度34.00米，含给水、弱电、绿化、亮化及道路交通等附属工程。	1919	4月中旬开工，8月底完成建设	韩定华	严社伟 贾大伟 李小维 赵大伟



合水县住建局2022年重点建设项目领导包抓分工表

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	进度进展要求	责任领导	包抓干部
7	合水商业街商业配套设施项目（合水商业街改造）	改造硬化原有12米宽、1100米长道路共计15400平方米，栽植行道树380棵，更换路灯188盏，更换商业门头175家，设置4800平方米停车场，硬化人行道7920平方米（海绵化处理），埋设管弱电管网13860米、电缆线4280米，安装花岗岩路沿石4200米，旧楼立面粉饰改造80000平方米。	2496.73	6月上旬完成招投标，11月底完成建设	赵宝平	杨永盛 温广平 赵文亮 孔令达
8	人民路延伸工程	道路长202.043米，道路红线宽为24米，道路等级为城市支路。含道路工程、交通工程、照明工程、给排水工程、通信工程、热力工程。	661.53	6月份开工，11月底完成建设	赵宝平	杨永盛 温广平 赵文亮 孔令达
9	秦直路延伸工程	道路长395.686米，道路红线宽为24米，道路等级为城市次干路。含道路工程、交通工程、照明工程、给排水工程、通信工程、热力工程。	1226.15	6月份开工，11月底完成建设	赵宝平	杨永盛 温广平 赵文亮 孔令达
10	古象路延伸工程	道路长158米，宽24米，含给水、排水、弱电、绿化、亮化等附属工程。	587	6月份开工，11月底完成建设	郭学超	门小强 姜娟 宫瑶 别海龙
前期项目						



合水县住建局2022年重点建设项目领导包抓分工表

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	进度进展要求	责任领导	包抓干部
1	合水县黄河象旅游基地基础设施建设项目—迎宾广场工程	占地52441平方米，敷设给排水管网386米，排水管网1200米，新建“大门”主题雕塑1座，铺装道路及场地硬化6000平方米，安装草坪灯80盏，景观带55盏，射灯32盏，高杆灯3盏，景观小品8座，景观雕塑10座，健身器材48套，公共厕所1座，绿化喷灌13800平方米。	2575	6月底完成项目前期，具备招标条件	安文涛	司龙龙 李涛涛 吕丽丽
2	合水县黄河象旅游基地基础设施建设项目—思文广场建设工程	占地35亩，绿化6000平方米，硬化5000平方米，安装健身器材50余套。	1171	5月底完成项目前期，具备招标条件	赵宝平	杨永盛 温广平 赵文亮 孔令达
3	合水县黄河象旅游基地基础设施建设项目—秦直广场建设工程	占地43.47亩，花岗岩铺装2617.72平方米，塑胶场地6343.17平方米，沥青路硬化4259.63平方米，绿化10051.65平方米，建设儿童活动器械8个，雕塑10座，管理用房1座。	1946	5月底完成项目前期，具备招标条件	郭学超	门小强 姜娟瑶 宫别海 龙
4	合水县黄河象旅游基地基础设施建设项目—中街广场工程	铺设透水砖14800平方米，建小游园930平方米，活动场地1200平方米，安装各类健身及休闲器材26套，高杆灯4个，射灯18个，文化墙140米，绿化4800平方米，漫步道4000米，排水管网600米、供水管300米。	2630	6月底完成项目前期，具备招标条件	安文涛	司龙龙 李涛涛 吕丽丽
11	合水县黄河象旅游基地基础设施建设项目—永宁广场工程	项目占地7.5亩，建地标雕塑1座，水冲厕所1座，绿化2000平方米，硬化2134.4平方米。	240	6月底完成项目前期，具备招标条件	韩定华	严社伟 李小维
5	合水县中街人民广场智能停车场建设工程	新建地上七层（地下局部一层）钢框架结构机械式升降横移立体智能停车场1处，设置停车位300个，配套建设附属设施。	4400	6月底完成项目前期，具备招标条件	安文涛	司龙龙 李涛涛 吕丽丽



合水县住建局2022年重点建设项目领导包抓分工表

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	进度进展要求	责任领导	包抓干部
6	大白路道路工程	道路全长884米，宽24米，配套给排水、照明、绿化等附属工程	795	7月底完成项目前期，具备招标条件	赵宝平	杨永盛 温广平 赵文亮 孔令达



合水县住房和城乡建设局文件

合建发〔2019〕45号

合水县住房和城乡建设局 关于印发《进一步推进重点项目“四个三” 工作机制的实施意见》的通知

机关各股室，局属各单位：

《合水县住建局关于进一步推进重点项目“四个三”工作机制的实施意见》已经局务会议同意，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。

合水县住房和城乡建设局

2019年2月19日



合水县住建局关于进一步推进重点项目 “四个三”工作机制的实施意见

为进一步创新项目管理机制，完善管理体系，提高项目建设工作的质量和水平，明确重点项目管理职责、任务及工作程序，切实加强组织领导和强化落实，加大重点项目建设推进步伐，确保高质量完成年度目标任务。经研究，决定建立“四个三”项目工作推进机制。

一、“三个一”责任包抓机制

为有序推进、全面落实重点项目建设任务，对年度确定的41个重点建设项目，严格落实“三个一”责任包抓机制，全方位抓好落实。

（一）一名分管领导。每个项目确定一名分管责任领导，从项目招投标、实施管理、阶段目标、竣工投运等环节全程负责跟进，对项目实施过程中的一些技术难题和信访矛盾纠纷负责及时排除和化解，严格按照项目要求的时间节点按期推进，确保项目程序合法、质量达标、进度靠前。

（二）一支工作队伍。每个项目确定一支工作队伍，按照项目推进方案要求的时间节点和任务量，配合分管领导协调解决项目建设过程中出现一些困难和问题，全程抓好项目落实，并做好施工记录及工程资料整理归档。工作人员要坚守岗位，服从领导，形成工作合力。



（三）一套推进方案。按照年度项目管理任务分工，各分管领导和工作人员一周内拿出项目推进方案，推进方案要逐项目抠出月进度，明确推进目标任务、时限要求、责任人，实行挂图作战，压茬推进，切实把项目建设责任落实到具体人，严格按时限要求推进，确保按期完成建设任务。

二、“三个一”协调推进机制

（一）一周一汇报。落实项目周汇报机制，各项目分管领导每周要书面向局务会议汇报项目实施情况，并签字上交。汇报内容主要包括甲方、施工、监理单位人员到岗履职情况，工程进度跟进情况，工程质量安全达标情况，项目实施过程中遇到的难点和困难，下一步解决办法和措施。

（二）半月一调度。落实半月现场调度机制，成立县住建局重点项目现场调度工作组，组长由党组书记、局长张彦斌同志担任，副组长由纪检组长徐芊雯、总工程师严社伟同志担任，成员为各项目分管领导。每半月由组长带队，深入各项目进行现场调度，协调解决项目实施过程中的一些困难和问题，并且核查项目管理是否规范、质量是否达标、进度是否赶上、安全措施是否落实。

（三）一月一研究。落实重点项目一月一研究机制，各分管领导对项目实施过程中存在的问题，图纸的变更、工程量的增减，实施过程中发生的签证，和周边群众的矛盾纠纷等问题汇总后提交会议集体研究解决，适当时候可以邀请设



计、施工、监理等单位人员参加，集体讨论研究解决对策，确保项目有序推进。

三、“三个”质量保障组

(一) 前期推进质量组。成立项目前期推进质量组，由总工程师严社伟负责，城建股配合对所有储备项目列出前期推进计划，并按照推进计划加快办理项目前期手续，确保项目前期资料齐全、程序合法，具备开工建设条件。

(二) 审查评审质量组。成立项目审查评审质量组，由郭学超同志负责，质监站、工程股、城建股配合，各项目包抓领导、总工程师参与，对项目前期可研、初步设计、施工图设计、预算编制等内容进行审查审定，确保项目实施过程中不出现设计及预算缺项、漏项，导致项目中途设计图纸大幅度变更、超概算等问题的发生。

(三) 验收核查质量组。成立项目核查验收组，由党组书记、局长张彦斌同志负责，纪检组、质监站相关人员，总工程师、各项目包抓领导参与。按照项目各个阶段验收要求，由施工企业提出申请，项目包抓领导负责组织各参建单位进行验收，验收合格后，由项目包抓领导汇报主要领导，主要领导带队进行现场核查。

四、“三项”督导机制

(一) 通报制度。依据年度计划和项目推进方案要求，由办公室牵头，相关股室配合，每月对重点项目进度进行汇



总，结合年度各项目推进方案进行分析，按项目完成计划投资率进行排名通报，连续两次排名靠后的项目责任领导及工作人员取消年度评优评先资格。

（二）约谈制度。凡具备下列情况之一的，由党组主要领导进行约谈：一是按照项目推进计划和时间节点要求，进展缓慢，影响全县整体进度的；二是对项目实施过程中落实不力，没有明确措施和明显工作进度的；三是因对项目前期论证不充分，导致项目在实施过程中，无客观因素而无法实施的；四是未经项目审查评审组审定同意，擅自变更计划建设内容、重要进度节点的；五是在推动项目过程中，主要领导认为确需约谈的其他情况。

（三）问责制度。对项目建设工作中，不出力、不扎实，造成项目落地难、建设进程滞缓的；对项目前期论证不充分，导致项目严重超概算的；对县委、县政府高度重视，社会关注度高的重大民生工程，因推动不力造成严重后果、局面被动的。由局纪检组进行调查，按照情节轻重予以问责，问题严重的上报县纪委监委和组织部门进行问责处理。

附件：县住建局 2019 年重点建设项目推进责任制分解表



中华人民共和国



建设用地规划许可证

地字第621024 202100009 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关 合水县自然资源局

日期 2021年8月24日



扫描全能王 创建


用地单位	合水县住房和城乡建设局
项目名称	合水县智能停车场建设项目
批准用地机关	合水县人民政府
批准用地文号	合政自然资发(2021)9号
用地位置	合水县城北区,北邻广场路,东邻成业路,与合水县政务中心斜对面
用地面积	2439.5 m ² (约 3.66 亩)
土地用途	公共管理与公共服务用地
建设规模	总建筑面积 1249.91 m ² , 新建立体车库一座及附属工程。
土地取得方式	划拨
附图及附件名称	

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核,建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的,属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意,本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定,与本证具有同等法律效力。



中华人民共和国



建设工程规划许可证

建字第621024 202100016 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关

合水县自然资源局

日期

2021年9月2日



扫描全能王 创建

建设单位(个人)	合水县住房和城乡建设局
建设项目名称	合水县智能停车场建设项目
建设位置	合水县人民路南侧,北邻人民路,东邻孙琪新城住宅小区西侧围墙,与合水县政务中心斜对面。
建设规模	新建立体车库一座,总建筑面积1249.91㎡,地上建筑面积为945.59㎡,地下建筑面积304.32㎡及附属工程。
附图及附件名称	
建设工程核定方案通知书	

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核,建设工程符合国土空间规划和用途管制要求的法律凭证。
- 二、未取得本证或不按本证规定进行建设的,均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意,本证的各项规定不得随意变更。
- 四、自然资源主管部门依法有权查验本证,建设单位(个人)有责任提交查验。
- 五、本证所需附图及附件由发证机关依法确定,与本证具有同等法律效力。



中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 621024202202110102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对应照信息



发证机关

发证日期

合水县住房和城乡建设局

工程名称

合水县智能停车场建设项目

建设地址

城北区，北邻广场路，东邻成业路，与合水县政务服务中心斜对。

建设规模

1249.91 (m2)

合同工期

2022-03-15-2022-12-12

合同价格

2303.985108 (万元)

参建单位

勘察单位

甘肃华圣建设工程有限公司

项目负责人

霍建朝

设计单位

首辅工程设计有限公司

项目负责人

梁作峰

施工单位

陕西泽恩建筑工程有限公司

项目负责人

乔一博

监理单位

甘肃鑫海建设监理咨询有限公司

总监理工程师

张兴林

工程总承包单位

陕西泽恩建筑工程有限公司

项目经理

乔一博

备注

注：本证为合水县住房和城乡建设局核发，有效期为一年，自2022年3月15日起至2023年3月14日止。本证在有效期内，方可用于办理相关手续。逾期失效，不得作为办理相关手续的依据。本证由合水县住房和城乡建设局负责解释。

合水县住房和城乡建设局

2022年3月15日

合水县住房和城乡建设局

2022年3月15日

合水县住房和城乡建设局

2022年3月15日

合水县住房和城乡建设局

2022年3月15日

合水县住房和城乡建设局

2022年3月15日

合水县住房和城乡建设局

2022年3月15日

合水县住房和城乡建设局

2022年3月15日

建筑工程施工许可证附件

工程名称：合水县智能停车场建设项目

施工许可证编号: 621024202202110102

建设单位: 合水县住房和城乡建设局

建设单位项目负责人： 安文涛

建设地址：城北区，北邻广场路，东邻成业路，与合水县政务服务中心斜对。

建筑工程项目明细单

[illegible]

总建筑面积: 1249.91

地下建筑面积: 304.32

24 11:



- 1、设计书附《建筑设计防火规范》一书校审
2、设计书与《建筑设计防火规范》一书同时使用方可有效



扫描全能王 创建





中标通知书

QYZC2021-0174-01号

首辅工程设计有限公司:



合水县住房和城乡建设局合水县智能停车场建设项目设计（二次）于 2021 年 08 月 16 日在庆阳市公共资源交易中心组织采购，经评标委员会评审，推荐你公司为中标候选人。合水县住房和城乡建设局 已确定你公司为 合水县住房和城乡建设局合水县智能停车场建设项目设计（二次） 中标供应商，特此通知，请务于本通知书发出30日内，与 合水县住房和城乡建设局 签定政府采购合同。中标内容如下：

项目名称	合水县住房和城乡建设局合水县智能停车场建设项目设计（二次）		
采购方式	公开招标		
中标范围	详见附表		
中标内容	1. 中标供应商：首辅工程设计有限公司 2. 总价：¥：686000.000000元（大写：陆拾捌万陆仟元整）		
交易中心：	采购人：	代理机构：	
			
2021年8月9日	2021年8月9日	2021年8月9日	





中标通知书

QYGC2021-0573-01号



甘肃鑫海建设监理咨询有限公司：

经评标小组 2021 年 11 月 11 日在庆阳市公共资源交易中心对 合水县智能停车场建设工程监理 监理项目进行评审，确定你公司为监理中标单位，公示期满，并被
我方接受，特此通知，请务于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标
内容如下：

项目名称	合水县智能停车场建设工程监理	
招标方式	公开招标	
监理范围	详见附表	
中标内容	1、监理价款：总价：（小写）：498000.000000元（大写）：肆拾玖万捌仟元整 2、工期：272日历天 3、质量工程：合格 4、项目部组成：总监理工程师：张兴林 监理员：耿瑞瑞；田万春	
交易中心：	招标人：	认证单位：
		
2021年11月2日	年 月 日	2021年11月2日

代理机构：甘肃财苑项目管理有限公司





中标通知书

QYGC2021-0572-01号

陕西泽恩建筑工程有限公司:



经评标小组 2021 年 11 月 25 日在庆阳市公共资源交易中心对合水县智能停车场建设工程项目进行评审,确定你公司为工程施工中标单位,公示期满,并被我方接受,特此通知,请于本通知书发出30日内,前来我单位商签合同事宜。中标内容如下:

项目名称	合水县智能停车场建设工程	
招标方式	公开招标	
中标范围	详见附表	
中标内容	1、工程造价:总价:(小写):29599881.980000元(大写):贰仟玖佰伍拾玖万玖仟捌佰捌拾壹元玖角捌分 2、工期:272日历天 3、质量工程:合格 4、项目部组成:项目经理:乔一博;技术负责人:邹章兵;安全生产负责人:汪世能;质检员:吴启豪;安全员:何康康;施工员:原一晨	
交易中心:	招标人:	认证单位:
		

代理机构:甘肃财苑项目管理有限公司



扫描全能王 创建



国库集中支付拨款申请单

申请单位(签章): 2022年1月18日 第 号

序号	项目名称 (资金用途)	收款企业			申请金额	工程名称	文号	备注
		全称	开户行	账号				
1	合水县智能停车场 工程款	陕西洋恩建筑工程有限公司甘肃分公司	中国农业银行股份有限公司合水县支行 营业室	27286101040012024	2205382.75			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	合计				2205382.75			
申请金额合计(大写) ¥:					申请金额合计(小写) ¥: 2205382.75元			

会计核算中心意见(盖章): 财务负责人(签字):
核算中心会计 (签字): 经办人(签字):





国库集中支付拨款申请单

申请单位(签章): 2022年1月18日 第 号

序号	项目名称 (资金用途)	收款企业			申请金额	工程名称	文号	备注
		全称	开户行	账号				
1	合水县智能停车场 工程款	陕西泽思建筑工程有限公司甘肃分公司	中国农业银行股份有限公司合水县支行 营业室	272861010400012024	6664617.25			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	合计				6664617.25			
申请金额合计(大写) ¥:					申请金额合计(小写) ¥: 6664617.25元			

会计核算中心意见(盖章):
会计核算中心会计 (签字):

财务负责人(签字):
经办人(签字):





国库集中支付拨款申请单

申请单位(签章):

2022年3月14日

第 号

序号	项目名称 (资金用途)	收款企业			申请金额	工程名称	文号	备注
		全称	开户行	账号				
1	合水县智能停车场 工程款	陕西泽恩建筑工程有限公司甘肃分公司	中国农业银行股份有限公司合水县支行 营业室	27286101040012024	5920000			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	合计				5920000			
申请金额合计(大写) ¥: 伍佰玖拾贰万元整		申请金额合计(小写) ¥: 5920000元						

会计核算中心意见(盖章):
核算中心会计 (签字):

财务负责人(签字):
经办人(签字):





国库集中支付拨款申请单

申请单位（签章）：

2022年5月20日

第 号

序号	项目名称 (资金用途)	收款企业			申请金额	工程名称	文号	备注
		全称	开户行	账号				
1	合水县智能停车场 工程款	陕西泽恩建筑工程有限公司甘肃分公司	中国农业银行股份有限公司合水县支行 营业室	27286101040012024	5900000			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	合计				5900000			
申请金额合计（大写）¥：					申请金额合计（小写）¥：5900000元			

会计核算中心意见(盖章):
核算中心会计 (签字):

财务负责人(签字):
经 办 人(签字):





国库集中支付拨款申请单

申请单位(签章): 2022年5月31日 第 号

序号	项目名称 (资金用途)	收款企业			申请金额	工程名称	文号	备注
		全称	开户行	账号				
1	合水县智能停车场工程款	陕西泽恩建筑工程有限公司甘肃分公司	中国农业发展银行庆阳市西峰区支行	203622801001000000635711	4310000			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	合计				4310000			
申请金额合计(大写) ¥:					申请金额合计(小写) ¥: 4310000元			

会计核算中心意见(盖章): 财务负责人(签字):
核算中心会计(签字): 经办人(签字):



合水县智能停车场资金支付情况

单位：合水县住房和城乡建设局

项目名称：智能停车场建设项目

2021024000

序号	项目	施工单位	合同金额（元）	专项下达资金（元）	已支付金额（元）	支付时间	备注
1	智能停车场建设项目	陕西泽恩建筑工程有限公司	29599881.98	25000000	8870000	2022. 2	
2					5920000	2022. 4	
3					5900000	2022. 5	
4					4310000	2022. 5	
合计					25000000		



合水县住建局工程款申请拨付单

项目名称: 合水县智能停车场建设工程

承包单位: 陕西泽恩建筑工程有限公司

监理单位: 甘肃鑫海建设监理咨询有限公司

合水县住建局:

我单位负责承建的 合水县智能停车场建设工程
为: 29599881.98 元, 工程进度:

工程, 合同金额

已支付

下剩 29599881.98 元。

兹申请拨付工程进度款

承包单位(盖章)

8870000 元, 请予审核。

(签字):

日期: 2021.12.22

驻地监理办审核意见:

同意支付

监理工程师

(签字):

日期: 2021.12.22

施工企业负责人审核意见:

企业负责人(签字):

高岩

日期: 2021.12.22

工程主管领导审核意见:

同意支付

主管领导(签字):

187736

日期: 2021.12.22

单位主要负责人意见:

主要负责人(签字):



日期: 2021.12.22



扫描全能王 创建

合水县住建局工程款申请拨付单

项目名称: 合水县智能停车场建设工程

承包单位: 陕西环恩建筑工程有限公司

监理单位: 甘肃鑫海建设监理咨询有限公司

合水县住建局:

我单位负责承建的合水县智能停车场建设工程, 合同金额为: 29599881.98 元, 工程进度: 基础开挖完成, 开始预付设备款。

已支付 8870000 元, 下剩 20729881.98 元。

兹申请拨付工程进度款 5920000 元, 请予审核。

承包方盖章

(签字):

日期:

驻地监理办审核意见:

监理工程师 (签字):

日期: 2022.3.14.

施工企业负责人审核意见:

企业负责人 (签字):

日期: 2022.3.11

工程主管领导审核意见:

此款项仅用于设备采购。

主管领导 (签字):

日期: 2022.3.11

单位主要负责人意见:

主要负责人 (签字):

日期: 2022.3.11



扫描全能王 创建

合水县住建局工程款申请拨付单

项目名称: 合水县智能停车场建设项目

承包单位: 陕西玖思建筑工程有限公司

监理单位: 甘肃鑫隆建设监理咨询有限公司

合水县住建局:

我单位负责承建的 合水县智能停车场建设 工程, 合同金额为: 29599881.98 元, 工程进度: 完成地下室一层及地基与基础工程, 设备采购及制作待进场安装


已支付 14790000.00

元, 下剩 14809881.98 元。

兹申请拨付工程进度款 5900000.00

元, 请予审核。

承包方 (盖章):



日期: 2022.5.17

驻地监理办审核意见:

属实, 请速拨付。

监理工程师 (签字): 王长兰

日期: 2022.5.17

施工企业负责人审核意见:

企业负责人 (签字): 高岩

日期: 2022.5.17

工程主管领导审核意见:

同意支付

主管领导 (签字): 王长兰

日期: 2022.5.18

单位主要负责人意见:

主要负责人 (签字): 王长兰

日期: 2022.5.18



扫描全能王 创建

合水县住建局工程款申请拨付单

项目名称: 合水县智能停车场建设项目

承包单位: 陕西海思建筑工程有限公司

监理单位: 甘肃鑫海建设监理咨询有限公司


合水县住建局:

我单位负责承建的合水智能停车场项目, 工程, 合同金额为: 29599881.⁹⁸ 元, 工程进度: 地基与基础完成, 钢结构进场安装, 设备正在生产。

已支付 20690000. 元, 下剩 8909881.⁹⁸ 元。

兹申请拨付工程进度款 4310000. 元, 请予审核。

承包方



日期: 2022.5.27

驻地监理办审核意见:

按合同约定条款支付, 请速审核。

监理工程师 (签字): 王艺平

日期: 2022.5.30

施工企业负责人审核意见:

企业负责人 (签字)



日期: 2022.5.27

工程主管领导审核意见:

同意支付

主管领导 (签字): 王艺平

日期: 2022.5.28

单位主要负责人意见:

主要负责人 (签字)



日期: 2022.5.30



扫描全能王 创建

预算拨款凭证 (收入凭证)

拨款日期 2022 年 月 日 第 号

收款单位	全称	陕西泽恩建筑工程有限公司		付款单位	全称	合水县会计核算中心资金代管专户														
	帐号	2076228017010000635711				帐号	610123006000002972													
	开户银行	中国农业发展银行庆阳市西峰支行				开户银行	甘肃银行合水支行													
拨款	人民币:						亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分			
金额	(大写) 肆佰叁拾壹万元整						¥	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0			
用途	住建局智能停车场项目																			
拨款单位盖章:							银行会计分录							复核: 柜面业务专用章 账号:						

2 此联是收款行的收入凭证



扫描全能王 创建



预算拨款凭证(收款通知)

拨款日期 2022 年 1 月 日 第 号

收款单位	全称	陕西泽恩建筑工程有限公司 甘肃分公司	付款单位	全称	合水县会计核算中心资金共管专户					
	帐号	27286101040012024		帐号	2709073029100033689					
	开户银行	中国农业银行台水县支行		开户银行	中国工商银行合水支行					
拨款金额	人民币: 贰佰贰拾万伍仟叁佰捌拾贰元柒角 (大写) 伍分			亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 2 2 0 5 3 8 2 7 5						
用途	住建局智能停车场									
该业务已提交中国工商银行 收款单位盖章: 行, 待后续处理。(01)			银行会计分录	(付) _____ 对方科目 _____ 复核员: _____ 记帐号: _____						

3 此联是给收款单位的收款通知

预算拨款凭证(收款通知)

拨款日期 2022 年 1 月 日 第 号

收款单位	全称	陕西泽恩建筑工程有限公司 甘肃分公司	付款单位	全称	合水县会计核算中心资金共管专户					
	帐号	27286101040012024		帐号	636030122000043491					
	开户银行	中国农业银行台水县支行		开户银行	合水县信用联社营业部					
拨款金额	人民币: 陆佰陆拾陆万肆仟陆佰叁拾柒元贰角伍分 (大写) 角伍分			亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 6 6 6 4 6 1 7 2 5						
用途	住建局智能停车场									
拨款单位盖章:			银行会计分录	2022.01.23 (6) 对方科目 _____ 复核员: _____ 记帐号: _____						

3 此联是给收款单位的收款通知



扫描全能王 创建

预算拨款凭证(收款通知)

拨款日期 2022 年 5 月 日 第 号

收款单位	全称	陕西泽惠建筑工程有限公司甘南分公司	付款单位	全称	台水县委审计中心资金代管专户																						
	帐号	37286101040012024		帐号	530030122000043491																						
	开户银行	中国农业银行股份有限公司台水县支行营业部		开户银行	台水县信用联社营业部																						
拨款金额	人民币:	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分											
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
用途	(大写) 伍佰玖拾万元整 住建局智能停车场																										
拨款单位盖章:			对方科目:																								
银行会计分录			复核员: 记帐号:																								

3 此联是给收款单位的收款通知

预算拨款凭证(收款通知)

拨款日期 2022 年 3 月 日 第 号

收款单位	全称	陕西泽惠建筑工程有限公司甘南分公司	付款单位	全称	台水县委审计中心资金代管专户																						
	帐号	37286101040012024		帐号	530030122000043491																						
	开户银行	中国农业银行股份有限公司台水县支行营业部		开户银行	台水县信用联社营业部																						
拨款金额	人民币:	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分											
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
用途	(大写) 伍佰玖拾贰万元整 住建局台水县智能停车场工程																										
拨款单位盖章:			对方科目:																								
银行会计分录			复核员: 记帐号:																								

3 此联是给收款单位的收款通知



扫描全能王 创建

智能停车场现场勘查

